

NOMBRE DEL CASO

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA




¿Qué significa “éxito” en términos de una iniciativa de sostenibilidad?

El éxito se da cuando, gracias a nuestra presencia e intervenciones, logramos que las comunidades de productores, nuestros socios, nuestro equipo y nuestra organización crezcan y se fortalezcan. Si todos los involucrados hemos mejorado con respecto a la condición previa a la intervención, si hemos aprendido y capitalizado esos aprendizajes, entonces hemos sido exitosos.



Localización

Huila:
Pitalito

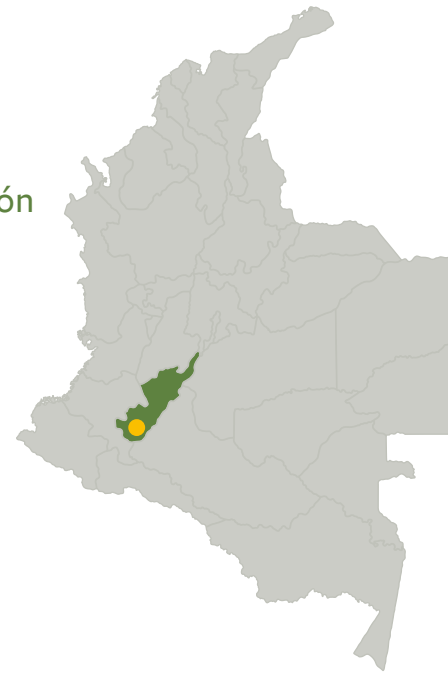

Objetivos relacionados en el marco del Acuerdo Café, Bosque y Clima

Objetivo 3:

Contribuir a la protección y restauración de los bosques de Colombia.



Fecha de inicio de la intervención
Junio de 2019



Objetivos de la intervención



Mejorar las condiciones de las zonas de conservación de cuerpos de agua en fincas participantes del proyecto.

Fecha de finalización de la intervención
Enero de 2021

Descripción del caso



Se trata de un proyecto liderado por ECOM, ejecutado en la región del Huila entre los años 2019 y 2021. Entre sus diversos alcances, el proyecto contemplaba la reforestación de 150 ha en zonas de conservación de cuerpos de agua con especies forestales nativas.

Inicialmente, se tenía planeado realizar las intervenciones de conservación en las fincas de los productores de café vinculados al proyecto. Sin embargo, al revisar las áreas disponibles para ser intervenidas en las fincas con esta finalidad, se encontró que eran muy pequeñas o inexistentes. Esto significaba que, de continuar con la idea de lograr reforestar las 150 ha en fincas cafeteras, sería necesario incluir un elevado número de predios, cuya gestión y administración no solo sería de gran complejidad, sino que también

generaría costos más elevados que los presupuestados para lograr la meta trazada. Esta situación marcó un punto de giro determinante para el desarrollo del proyecto.

Por otro lado, en conversaciones con la comunidad se hizo evidente la necesidad de intervenir con aislamiento y/o reforestación varias reservas naturales pertenecientes a acueductos veredales o a la Alcaldía local. En ese momento, se tomó la decisión de cambiar de estrategia y trabajar con las comunidades y autoridades locales para identificar las reservas prioritarias y los tipos de intervención requeridos. Para las obras se contrató una organización de productores que a su vez empleó a múltiples miembros de la comunidad, quienes ejecutaron las tareas requeridas para dar cumplimiento a las metas trazadas por el proyecto.



Resultados de la intervención

- ✓ 52 cuerpos de agua protegidos mediante aislamientos físicos.
- ✓ 24 zonas de reserva de cuerpos de agua con condiciones de cobertura natural mejoradas.
- ✓ 438 ha de áreas de conservación existentes protegidas y enriquecidas con especies forestales nativas. Con esto, se aporta a la protección de especies de flora y fauna amenazadas presentes en las áreas protegidas, mejorando los niveles de conservación de la biodiversidad de la zona.
- ✓ 850 personas del municipio de Pitalito beneficiadas por la protección de los cuerpos de agua que abastecen los acueductos veredales de los cuales reciben su suministro.

Factores determinantes del éxito en este caso



- ✓ El equipo encargado de la implementación del proyecto, el cual ha estado motivado por generar un impacto positivo en la comunidad.
- ✓ Tener claro a donde se quería llegar: la meta.
- ✓ La capacidad de adaptación a condiciones cambiantes y asumir los retos como oportunidades.

Aprendizajes



- ✓ Es importante capitalizar las dificultades que se pueden presentar en el desarrollo de un proyecto. Esto implica ver las dificultades como oportunidades para ajustar los planes y lograr los objetivos del proyecto e, incluso, sobrepasar las metas planteadas al inicio del proceso.
- ✓ Es necesario formular proyectos o intervenciones que consideren más profundamente la realidad de las comunidades y del territorio.
- ✓ Involucrar diferentes actores presentes en el territorio, así como sus intereses y necesidades es determinante para el logro de los objetivos de cualquier proyecto de sostenibilidad.
- ✓ Es importante buscar la eficacia operacional: alcanzar el mayor impacto con los recursos disponibles.

“Es necesario aprender y mejorar en el proceso”.

“Cada parte del proceso debe hacerse lo mejor posible”.

“Es clave considerar las diferencias entre regiones y escuchar las necesidades e intereses de las comunidades y aportes del equipo local”.

Contacto: Amalia Muñoz – Líder de sostenibilidad
Correo electrónico: amunoz@ecomtrading.com



Solidaridad

